規制番号　名称	1-0900 共力橋北詰　(S9-TCU)	運　用	2015年3月17日	製造番号	K0000009
				製造年月	2015年2月
管制番号　名称	10900 共力橋北詰　1012号「版3」	開始日時	15時54分　～	メーカー	日本信号㈱

＝工事概要＝
1　地域制御機改良工事（特定）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕様書1012号「版3」　S9-TCU付　1基
D型配電盤　UC用　警察L　切替開閉器・ﾕﾆｯﾄ付　1面
○撤去機材
A型交通信号制御機　H4.11製造　1基（処分）
A型配電盤　1面（処分）
2　U D設置工事（特定）
○主要機材
端末区間用事後長送装置　S9回線中継接続用　1基
通信ケーブル　F.CPEV-SSD(0.65×3P)　2ｍｍ　2径間
電源ケーブル　CVV-SSD(2□×2P)　2ｍｍ　2径間
3　改修工事（恵果）
○撤去機材
防護シート　1枚（処分）

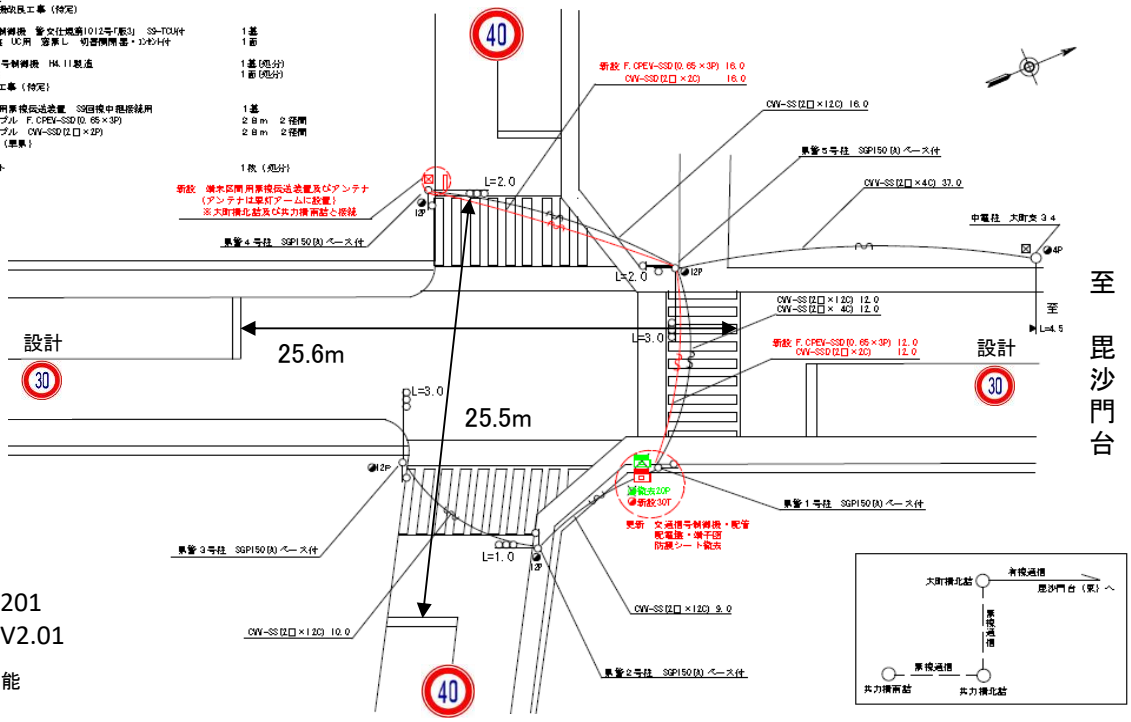

EC5502A-201
PD1220A V2.01

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
PU	109					109														
PL　(45秒)	10	5	2	3	2	10	5	2	3	3										
保安秒時(140秒)	86	5	2	3	2	29	5	2	3	3										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-0900 共力橋北詰	運 用	H. 5年 5月25日	製造番号	2F2266
管制番号 名称	170900 共力橋北詰 （A集中）	開始日時	15時20分 ～	製造年月	平成 4年11月

至 共力橋南詰

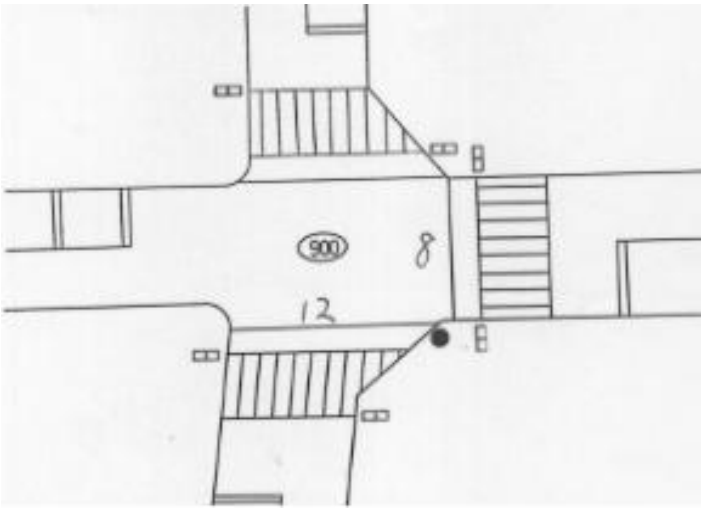

至 安佐中学校北

ステータス機能
S3:閃光
その他

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P ［1P］	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―									
保安秒時(110秒)	22	22	6	10	3	2	24	6	10	3	2									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									
